




ONTWIKKELD PROFIEL

Langteschaal 1:500 Hoogteschaal 1:200

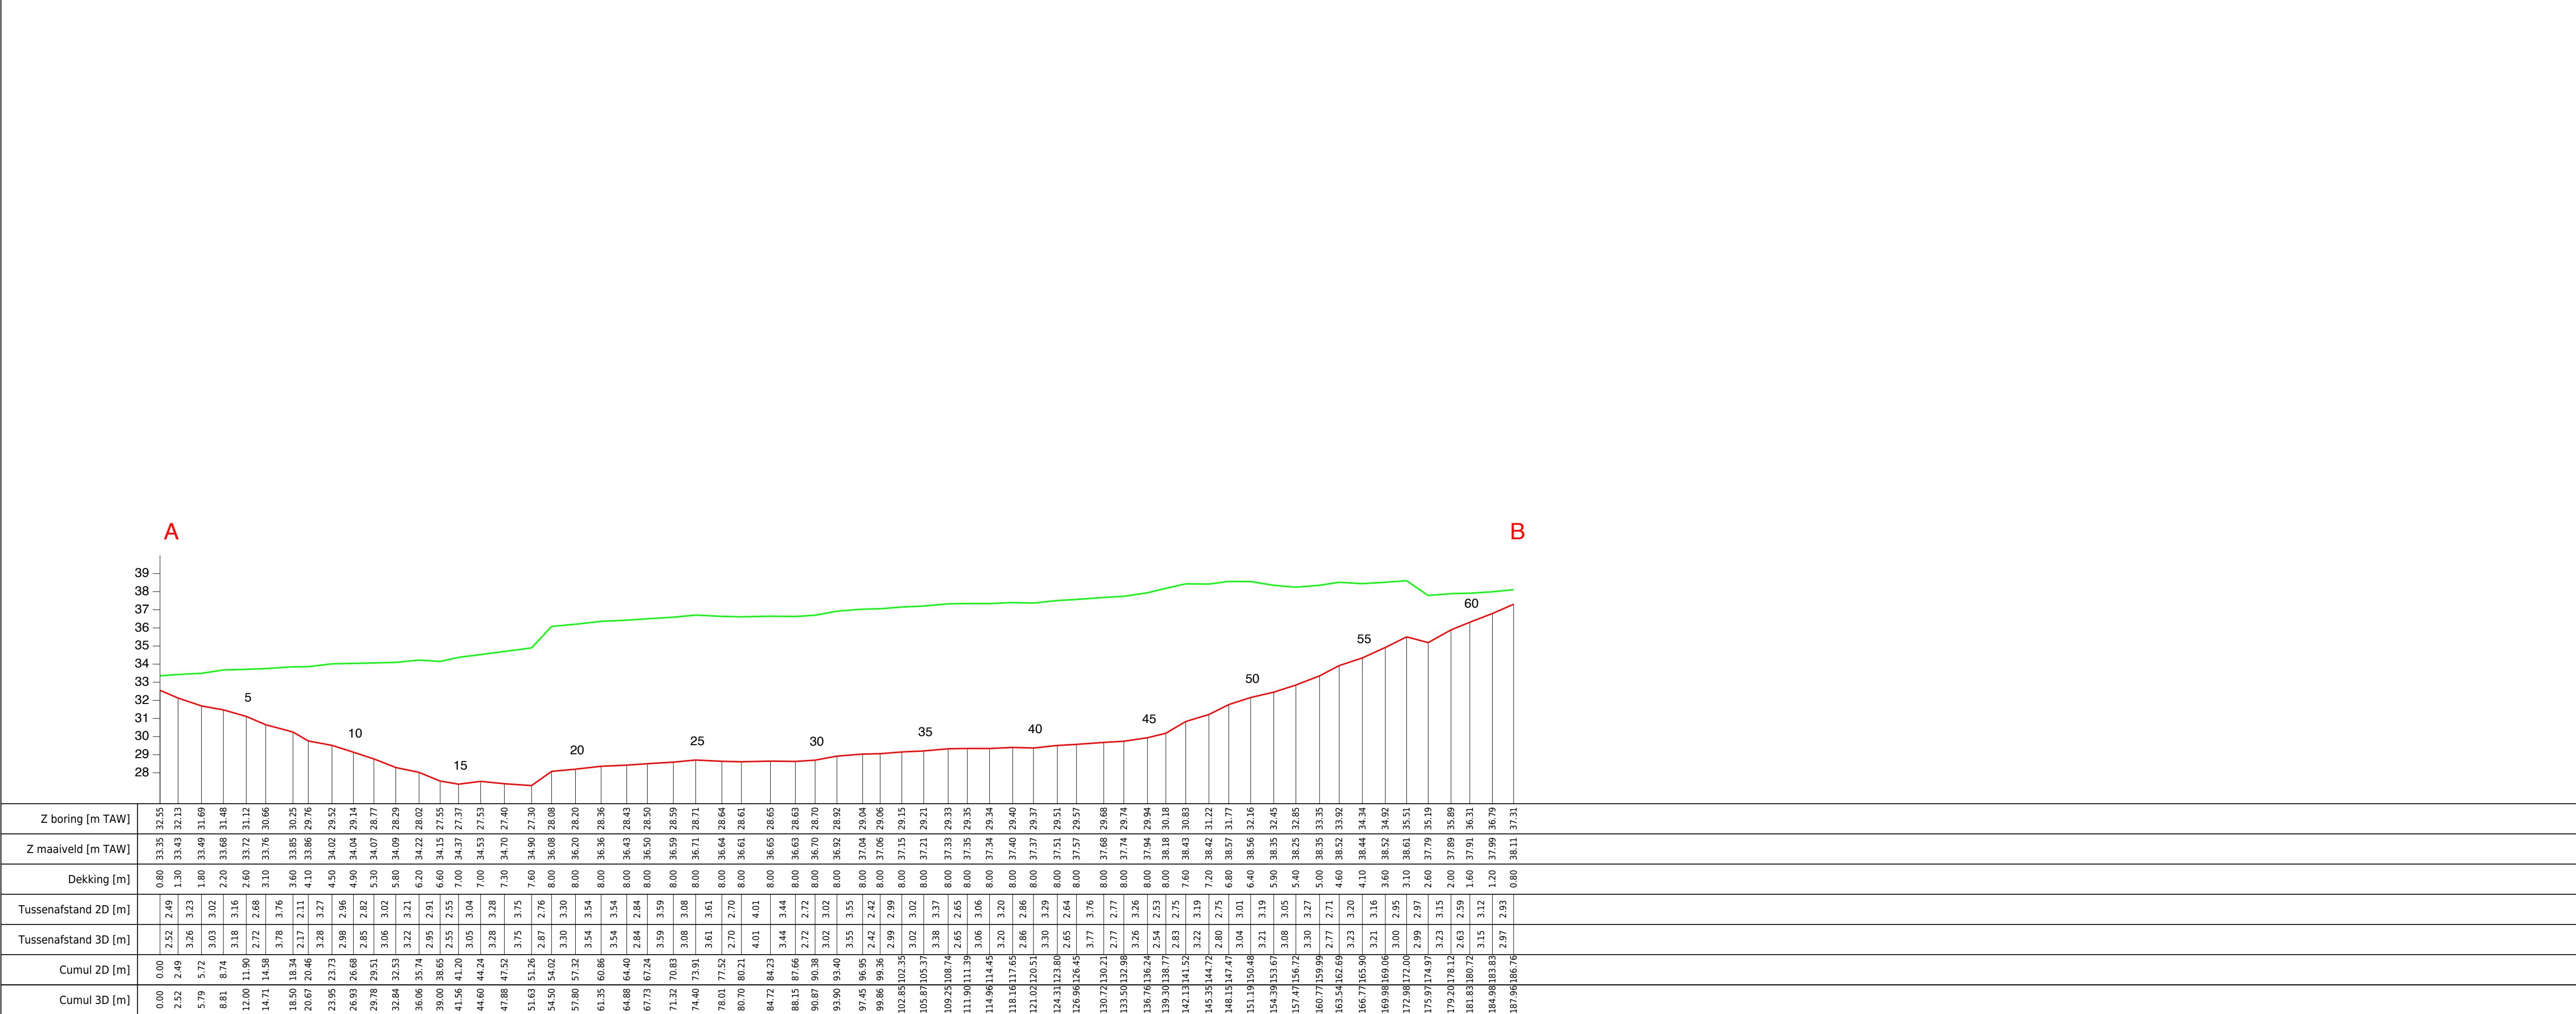

LIGGINGS- en DEKKINGSTABEL - Lambert 72 - TAW					
Punt	X	Y	Z	Dekking	Info
A	67699.81	164992.68	32.55	0.80	Intredepunt
2	67702.21	164992.03	32.13	1.30	
3	67705.33	164991.19	31.69	1.80	
4	67708.25	164990.43	31.48	2.20	
5	67711.36	164989.82	31.12	2.60	
6	67713.96	164989.19	30.66	3.10	
7	67717.62	164988.33	30.25	3.60	
8	67719.71	164987.98	29.76	4.10	
9	67722.90	164987.28	29.52	4.50	
10	67725.78	164986.59	29.14	4.90	
11	67728.53	164985.95	28.77	5.30	
12	67731.49	164985.33	28.29	5.80	
13	67734.61	164984.62	28.02	6.20	
14	67737.45	164983.97	27.55	6.60	
15	67739.93	164983.37	27.37	7.00	
16	67742.89	164982.69	27.53	7.00	
17	67746.08	164981.95	27.40	7.30	
18	67749.73	164981.07	27.30	7.60	
19	67752.24	164979.94	28.08	8.00	
20	67755.42	164979.07	28.20	8.00	
21	67758.85	164978.19	28.36	8.00	
22	67762.26	164977.23	28.43	8.00	
23	67765.01	164976.50	28.50	8.00	
24	67768.47	164975.56	28.59	8.00	
25	67771.44	164974.75	28.71	8.00	
26	67774.92	164973.79	28.64	8.00	
27	67777.53	164973.13	28.61	8.00	
28	67781.45	164972.28	28.65	8.00	
29	67784.79	164971.47	28.63	8.00	
30	67787.47	164970.99	28.70	8.00	
31	67790.40	164970.26	28.92	8.00	
32	67793.85	164969.44	29.04	8.00	
33	67796.18	164968.81	29.06	8.00	
34	67799.09	164968.12	29.15	8.00	
35	67802.02	164967.38	29.21	8.00	
36	67805.31	164966.67	29.33	8.00	
37	67807.87	164965.97	29.35	8.00	
38	67810.82	164965.15	29.34	8.00	
39	67813.94	164964.48	29.40	8.00	
40	67816.72	164963.80	29.37	8.00	
41	67819.94	164963.09	29.51	8.00	
42	67822.51	164962.49	29.57	8.00	
43	67826.18	164961.63	29.68	8.00	
44	67828.87	164961.00	29.74	8.00	
45	67832.01	164960.12	29.94	8.00	
46	67834.46	164959.46	30.18	8.00	
47	67837.14	164958.83	30.83	7.60	
48	67840.21	164957.96	31.22	7.20	
49	67842.92	164957.48	31.77	6.80	
50	67845.85	164956.79	32.16	6.40	
51	67848.97	164956.15	32.45	5.90	
52	67851.95	164955.49	32.85	5.40	
53	67855.11	164954.64	33.35	5.00	
54	67857.71	164953.90	33.92	4.60	
55	67860.83	164953.17	34.34	4.10	
56	67863.92	164952.52	34.92	3.60	
57	67866.78	164951.80	35.51	3.10	
58	67869.66	164951.12	35.19	2.60	
59	67872.74	164950.45	35.89	2.00	
60	67875.27	164949.86	36.31	1.60	
61	67878.28	164949.04	36.79	1.20	
B	67881.16	164948.52	37.31	0.80	Uitredepunt

GESTUURDE BORING PLAN PREBUILT

LIGGING Spoorwegstraat 125, 8930 Menen

Punt A Spoorwegstraat 125

Punt B Aalbeeksesteenweg 6

UITVOERDER KALE-TECH BV Langestraat 79 9240 Zele 0483 27 19 04 kale-tech@hotmail.com	OPDRACHTGEVER JACOPS NV Nijverheidsweg 31 8540 Deerlijk 056/77 84 51 info@jacops.be
 KALE TECH Nauwkeurigheden te evalueren i.f.v. de toegepaste plaats- bepalings- en opmeettechniek.	
INHOUD	1x0160
UITVOERING / OPMETING	Gestuurde boring RTK + walkover
DATUM UITVOERING (pilot)	Nog te bepalen
REFERENTIES	25237467 Lengte boring = 187.96 m

Planonline doc. nr. plan_12_20260924_A1_4096c026-007c-4039-ab5a-449a41917755.pdf
